

土木・建築設備写真票



No. 1

土木、建築施設

計量棟

トラックスケール手前のアスファルトに減肉、亀裂が認められる。(要観察)

良




No. 2

土木、建築施設

中継槽ポンプ室

壁面にクラックが認められるが、特に支障は認められない。

良

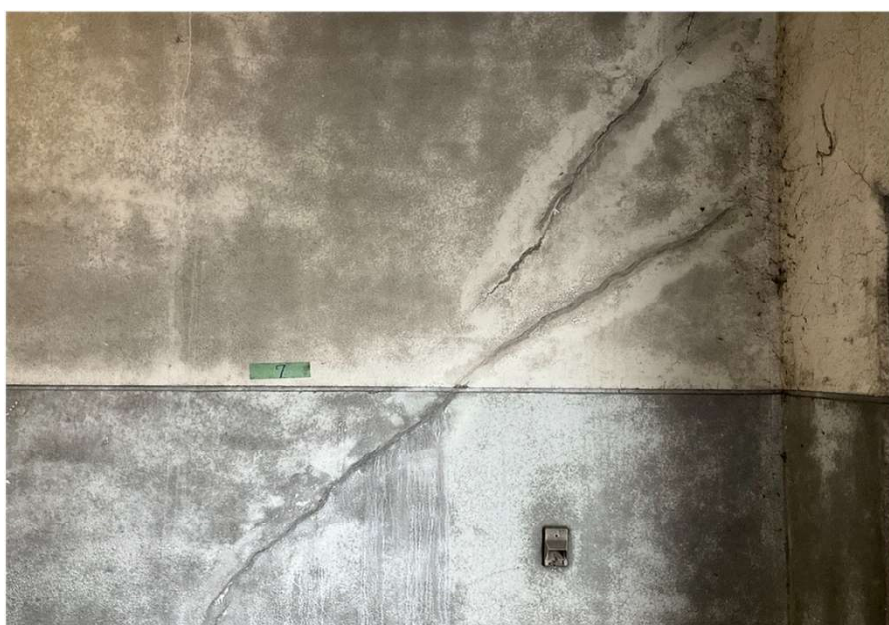

No. 3

土木、建築施設

搬入車床

壁面にクラックが多数認められる。(要観察)

良



No. 4

土木、建築施設

搬入車床

壁面にクラックが多数認められる。(要観察)

良




No. 5

土木、建築施設

搬入車床

壁面にクラックが多数認められる。(要観察)

良

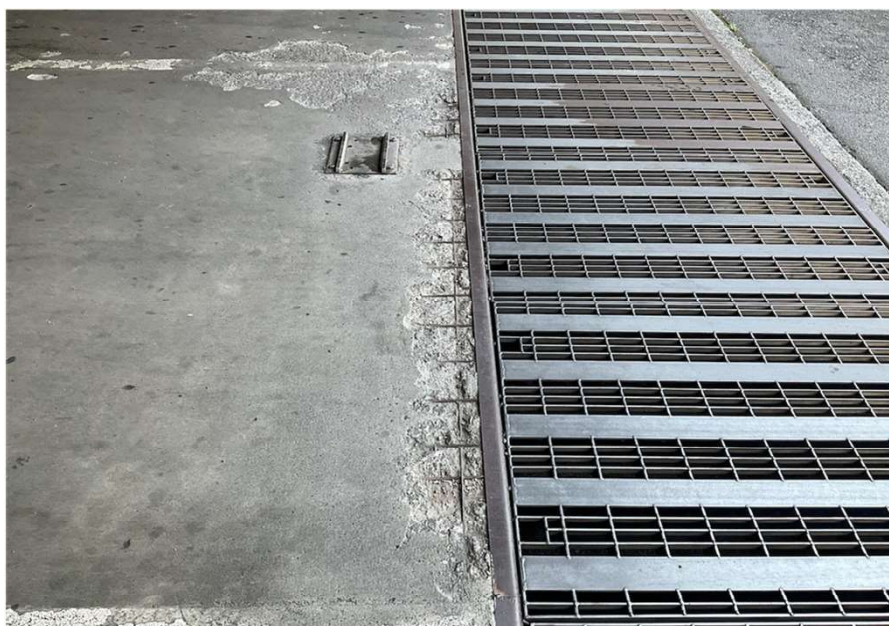


No. 6

土木、建築施設

搬入車床

出口部の床コンクリートが欠損し、鉄筋が露出している。

要補修

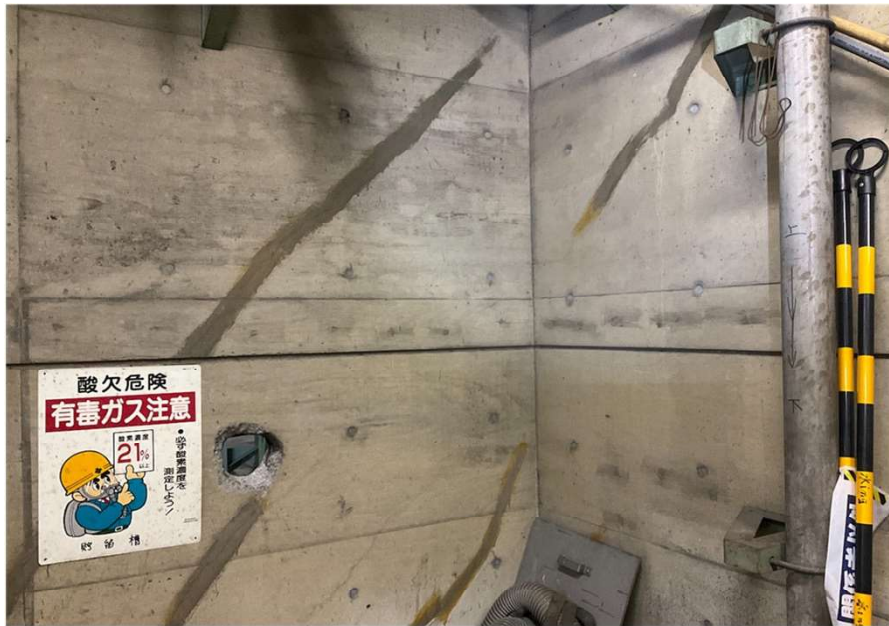

No. 7

土木、建築施設

除砂室

(搬入車床)

壁面(一部補修済)にクラックが多数認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 8

土木、建築施設

除砂室

(搬入車床)

床面にクラックが多数認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 9

土木、建築施設

機械棟ポンプ室

床面に細かいクラックが多数認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 10

土木、建築施設

機械棟ポンプ室

天井にクラック、漏水跡が認められる。(要観察)

良



No. 11

土木、建築施設

機械棟ポンプ室

天井にクラック、漏水跡が認められる。(要観察)

良




No. 12

土木、建築施設

機械棟ポンプ室

集水槽東側の壁面にクラック、漏水跡が認められる。(一部補修済)

要補修

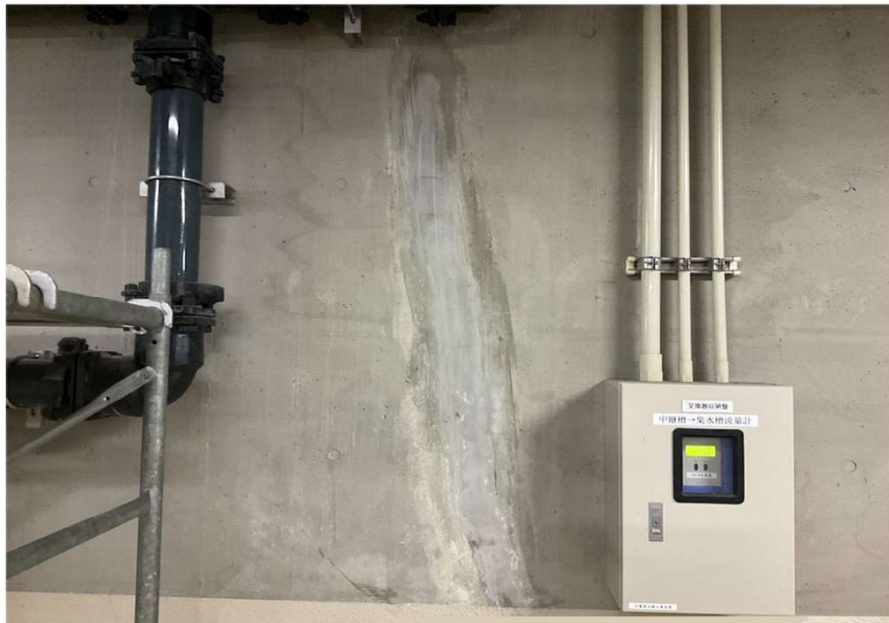


No. 13

土木、建築施設

機械棟ポンプ室

集水槽東側の壁面にクラック、漏水跡が認められる。(一部補修済)

要補修

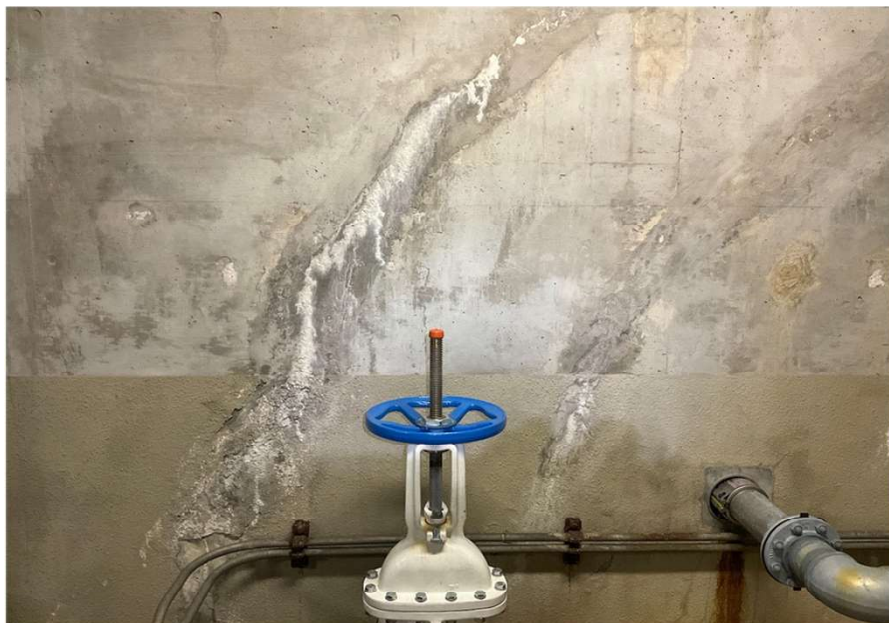


No. 14

土木、建築施設

機械棟ポンプ室

プラント用水槽西側の壁面にクラック、コンクリートの爆裂、漏水跡が認められる。

要補修

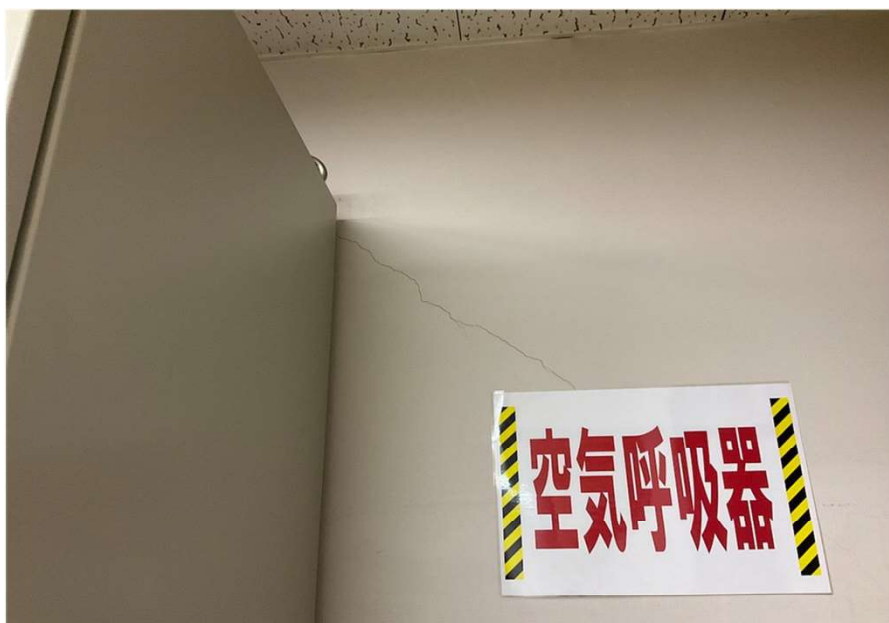

No. 15

土木、建築施設

操作室

(旧焼却監視室)

壁面にクラックが認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 16

土木、建築施設

脱水機室

床面のコンクリートが
えぐれて水が溜まって
いるが、特に支障は認
められない。

良




No. 17

土木、建築施設

脱水機室

天井に漏水跡が認め
られるが、特に支障は
認められない。

良

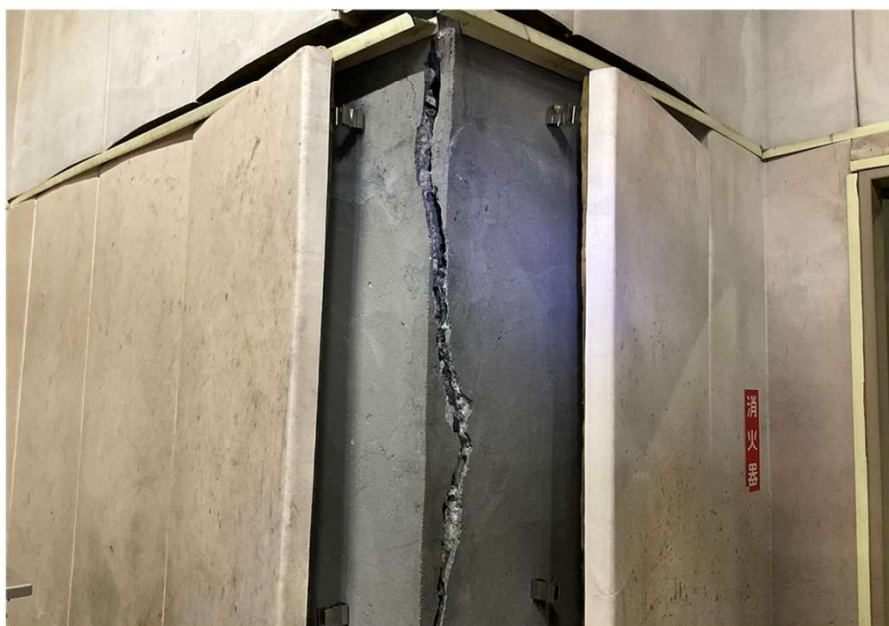

No. 18

土木、建築施設

脱水機室

柱型のコンクリートに
爆裂が認められる。

要補修



No. 19

土木、建築施設

前処理室

壁面にクラック認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 20

土木、建築施設

前処理室

床面にクラック認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 21

土木、建築施設

薬注室ポンプ室

(脱水機)

壁面にクラック、漏水跡が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 22

土木、建築施設

薬注室ポンプ室

(脱水機)

壁面にクラック、漏水跡が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 23

土木、建築施設

薬注室ポンプ室

(脱水機)

床面にクラックが多数認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 24

土木、建築施設

脱臭室

床面にクラックが多数認められるが、特に支障は認められない。

良




No. 25

土木、建築施設

アルコールポンプ室

床面に液漏れ跡が認められるが、特に支障は認められない。

良

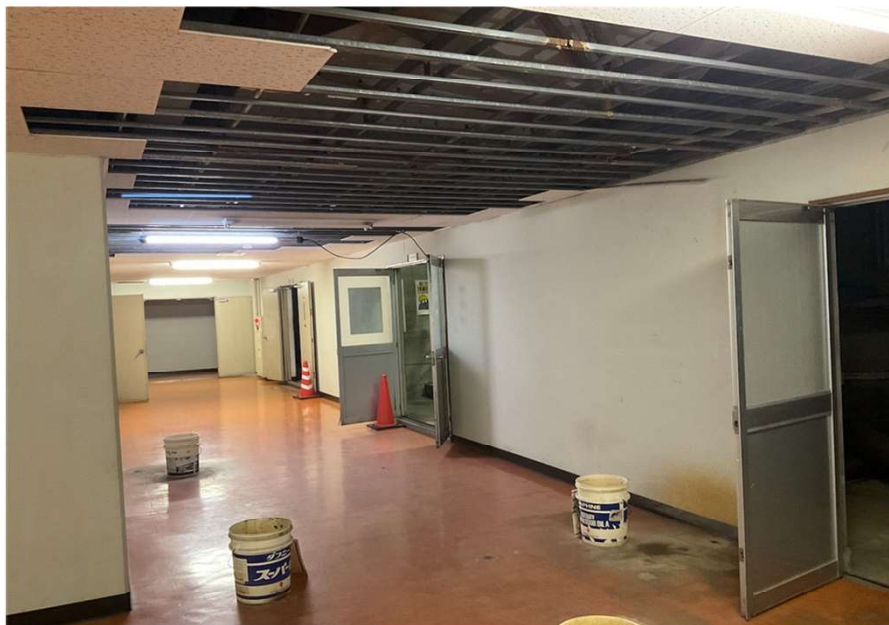

No. 26

土木、建築施設

倉庫オレンジロード

天井補修中。

—



No. 27

土木、建築施設

ホッパ室

壁面にクラックが認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 28

土木、建築施設

ホッパ室

床面にクラックが多数認められるが、特に支障は認められない。

良




No. 29

土木、建築施設

ホッパ室

床面にクラックが多数認められるが、特に支障は認められない。

良

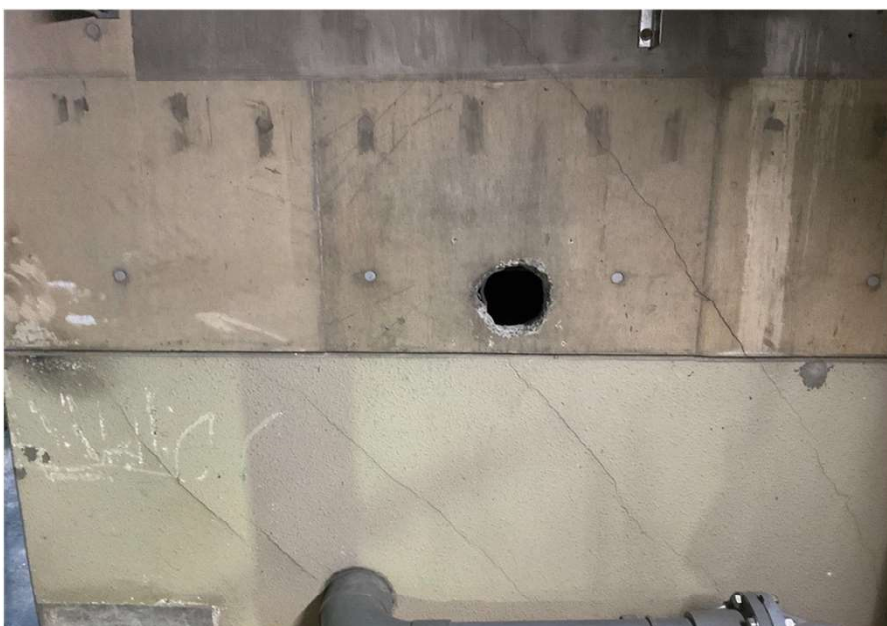

No. 30

土木、建築施設

旧乾燥焼却炉室

壁面にクラックが多数認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 31

土木、建築施設

旧乾燥焼却炉室

床面にクラックが多数認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 32

土木、建築施設

旧乾燥焼却炉室

床面にクラックが多数認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 33

土木、建築施設

旧乾燥焼却炉室

天井に漏水跡が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 34

土木、建築施設

旧乾燥焼却炉室

第一攪拌槽東側の壁面にクラック、漏水が認められる。

要補修




No. 35

土木、建築施設

旧乾燥焼却炉室

第一攪拌槽東側の壁面にクラック、漏水が認められる。

要補修

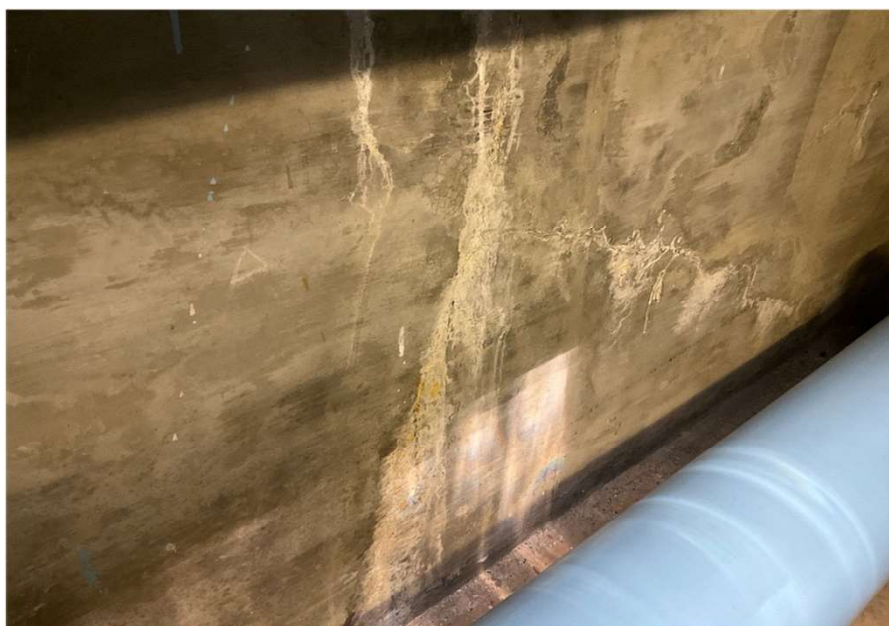

No. 36

土木、建築施設

共同溝A

濃縮槽西側の壁面にクラック、漏水跡が認められる。(要観察)

良



No. 37

土木、建築施設

共同溝A

天井にクラック、エフロ
レッセンスが多数認め
られる。(要観察)

良



No. 38

土木、建築施設

共同溝A

天井にクラック、エフロ
レッセンスが多数認め
られる。(要観察)

良



No. 39

土木、建築施設

共同溝A

濃縮槽西側の壁面に
クラック、漏水が認め
られる。

要補修




No. 40

土木、建築施設

処理棟ポンプ室

壁面にクラック、漏水跡が多数認められるが、特に支障は認められない。

良

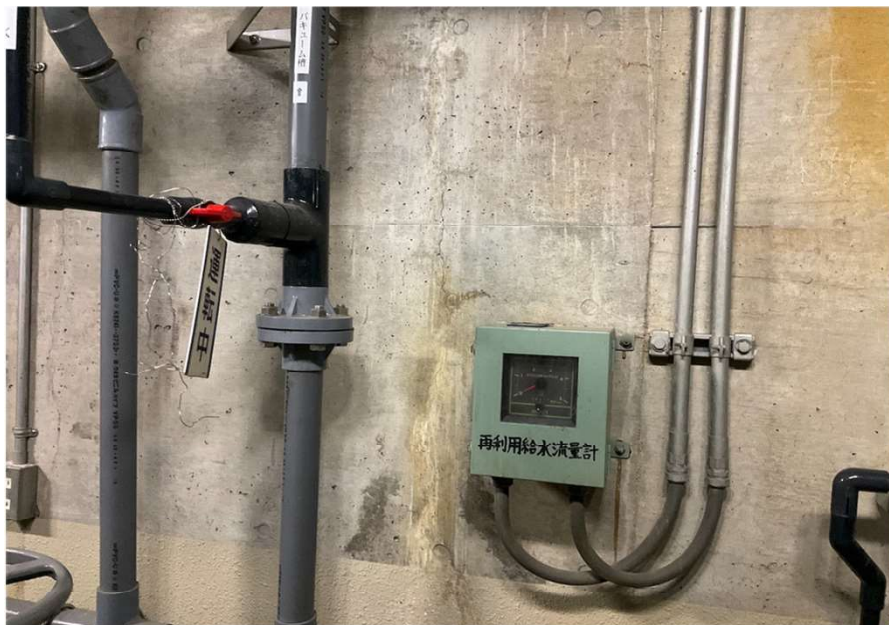

No. 41

土木、建築施設

処理棟ポンプ室

壁面にクラック、漏水跡が多数認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 42

土木、建築施設

処理棟ポンプ室

壁面にクラック、漏水跡が多数認められるが、特に支障は認められない。

良




No. 43

土木、建築施設

処理棟ポンプ室

壁面にクラック、漏水跡が多数認められるが、特に支障は認められない。

良

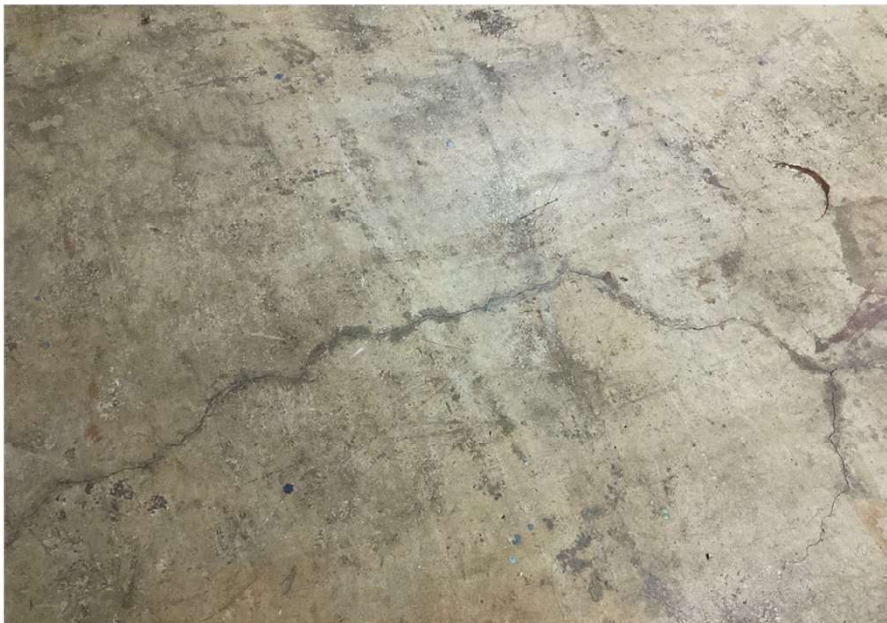

No. 44

土木、建築施設

処理棟ポンプ室

床面にクラックが多数認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 45

土木、建築施設

薬注室(処理棟)

壁面にクラックが多数(一部補修済)認められるが、特に支障は認められない。

良




No. 46

土木、建築施設

薬注室(処理棟)

壁面にクラックが多数
(一部補修済)認めら
れるが、特に支障は
認められない。

良

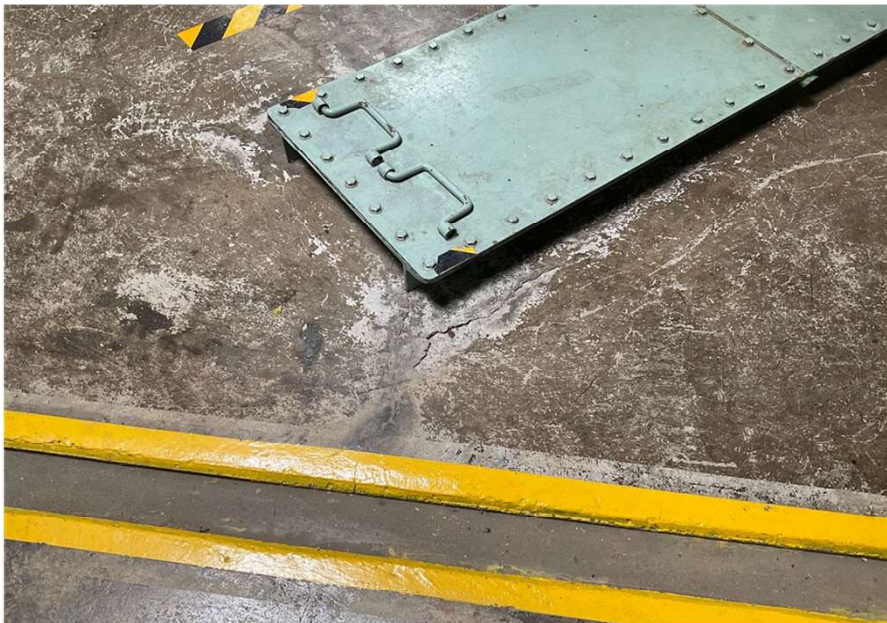

No. 47

土木、建築施設

薬注室(処理棟)

床面にクラックが多数
認められるが、特に支
障は認められない。

良




No. 48

土木、建築施設

薬注室(処理棟)

床面にクラックが多数
認められるが、特に支
障は認められない。

良

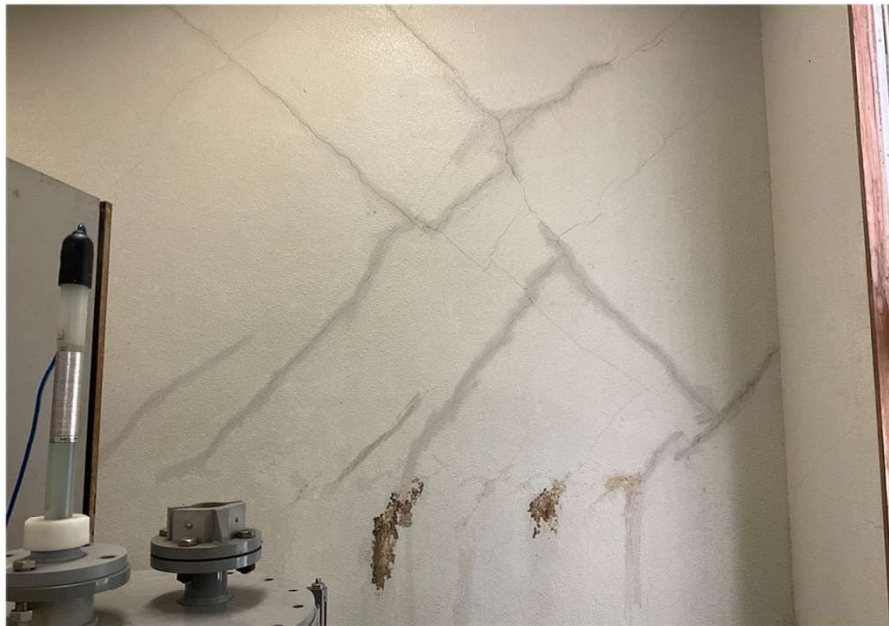


No. 49

土木、建築施設

放流監視室

壁面にクラックが多数（一部補修済）認められるが、特に支障は認められない。

良

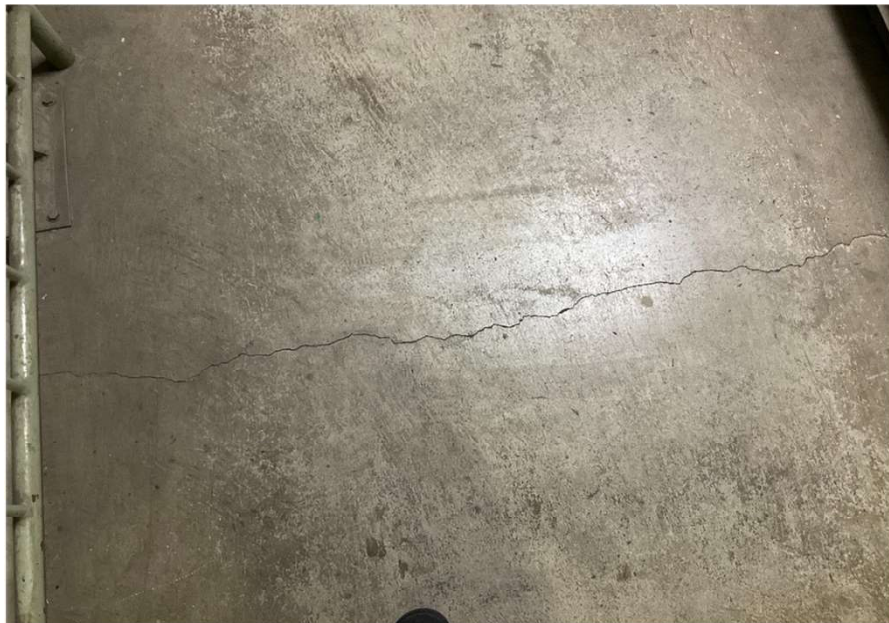

No. 50

土木、建築施設

中間歩廊

床面にクラックが認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 51

土木、建築施設

中間管廊

1系水槽側壁面にクラック、漏水が認められる。

要補修



No. 52

土木、建築施設

中間管廊

1系水槽側壁面に漏水が認められる。

要補修




No. 53

土木、建築施設

中間管廊

1系水槽側壁面に漏水が認められる。

要補修

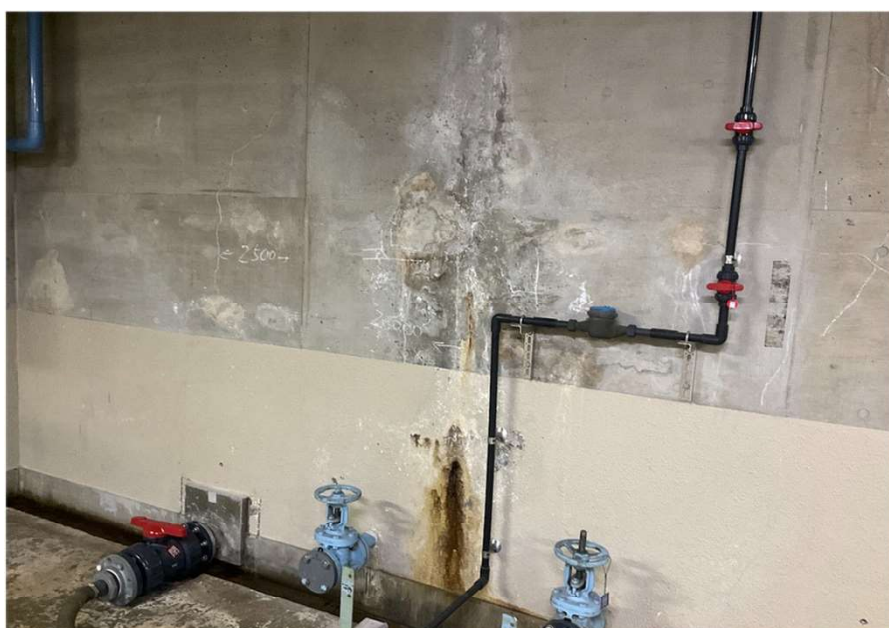

No. 54

土木、建築施設

中間管廊

1系水槽側壁面に漏水が認められる。

要補修




No. 55

土木、建築施設

中間管廊

1系水槽側壁面にクラック、漏水が認められる。

要補修

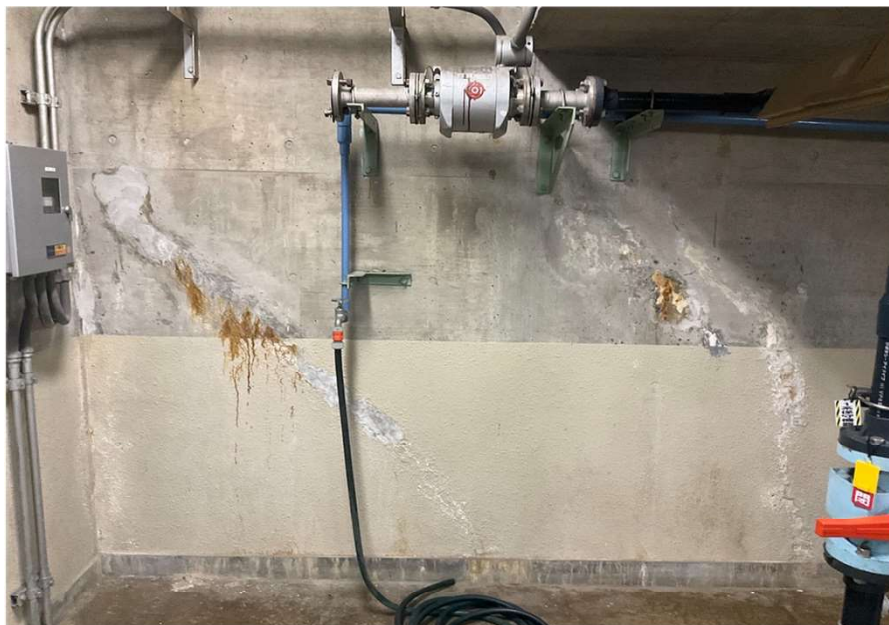


No. 56

土木、建築施設

中間管廊

1系水槽側壁面にクラック、漏水が認められる。

要補修

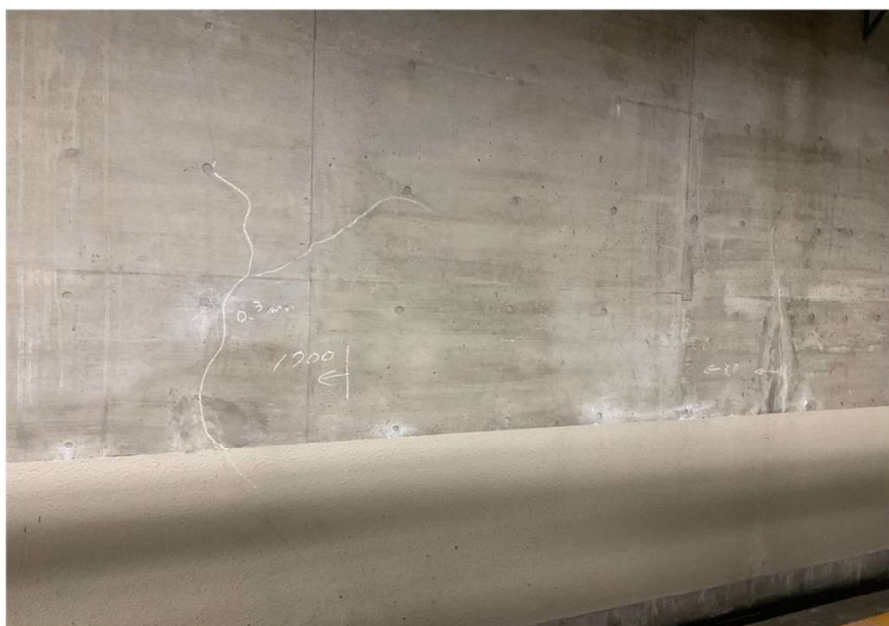

No. 57

土木、建築施設

中間管廊

1系水槽側壁面にクラックが認められる。

要補修



No. 58

土木、建築施設

中間管廊

2系水槽側壁面に漏水跡が認められる。

要補修




No. 59

土木、建築施設

中間管廊

2系水槽側壁面に漏水跡が認められる。

要補修

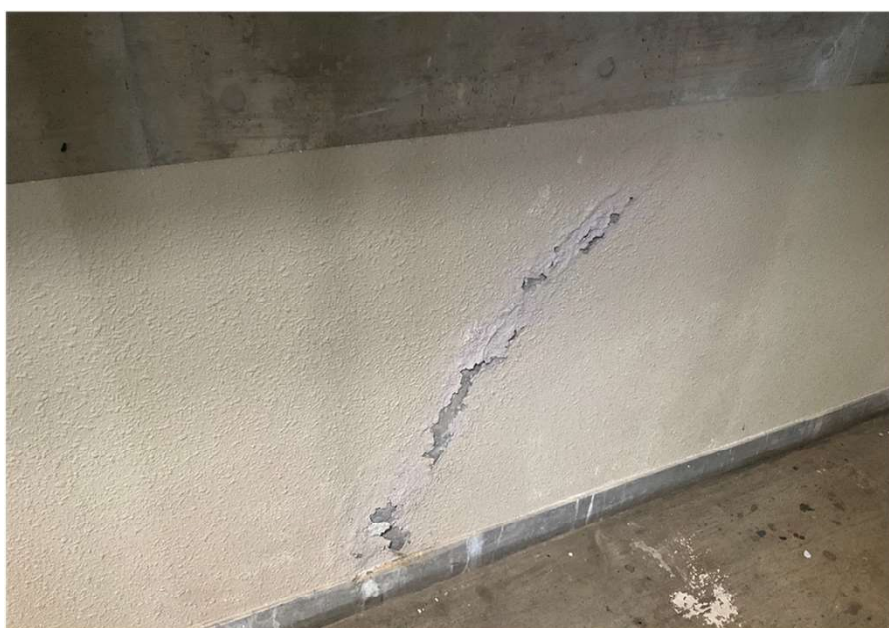

No. 60

土木、建築施設

中間管廊

2系水槽側壁面にクラックが認められる。

要補修



No. 61

土木、建築施設

オゾン発生機室

壁面にクラック、漏水跡が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 62

土木、建築施設

オゾン発生機室

壁面にクラックが認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 63

土木、建築施設

オゾン発生機室

壁面に漏水跡が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 64

土木、建築施設

オゾン発生機室

床面にクラックが認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 65

土木、建築施設

工作室

壁面にクラック(補修済)が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 66

土木、建築施設

工作室

床面にクラックが認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 67

土木、建築施設

工作室

天井に水漏れ跡が多数認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 68

土木、建築施設

油庫室

壁面にクラック(大半が補修済)が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 69

土木、建築施設

油庫室

壁面にクラック(大半が補修済)が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 70

土木、建築施設

油庫室

床面にクラックが認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 71

土木、建築施設

槽上部室

壁面にクラックが多数（一部補修済）認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 72

土木、建築施設

槽上部室

壁面にクラックが多数（一部補修済）、漏水跡が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 73

土木、建築施設

槽上部室

壁面にクラックが多数（一部補修済）、漏水跡が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 74

土木、建築施設

槽上部室

床面にクラックが多数認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 75

土木、建築施設

槽上部室

天井に雨漏りが認められる。

要補修



No. 76

土木、建築施設

槽上部室

天井に雨漏りが認められる。

要補修



No. 77

土木、建築施設

倉庫水ing

壁面にクラック(補修済)が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 78

土木、建築施設

倉庫水ing

天井に漏水跡が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 79

土木、建築施設

処理棟屋上

全体的に劣化しており、一部防水シートの剥がれが認められる。

要補修



No. 80

土木、建築施設

処理棟屋上

全体的に劣化しており、一部防水シートの剥がれが認められる。

要補修



No. 81

土木、建築施設

処理棟屋上

全体的に劣化しており、一部防水シートの剥がれが認められる。

要補修




No. 82

土木、建築施設

処理棟屋上

全体的に劣化しており、一部防水シートの剥がれが認められる。

要補修

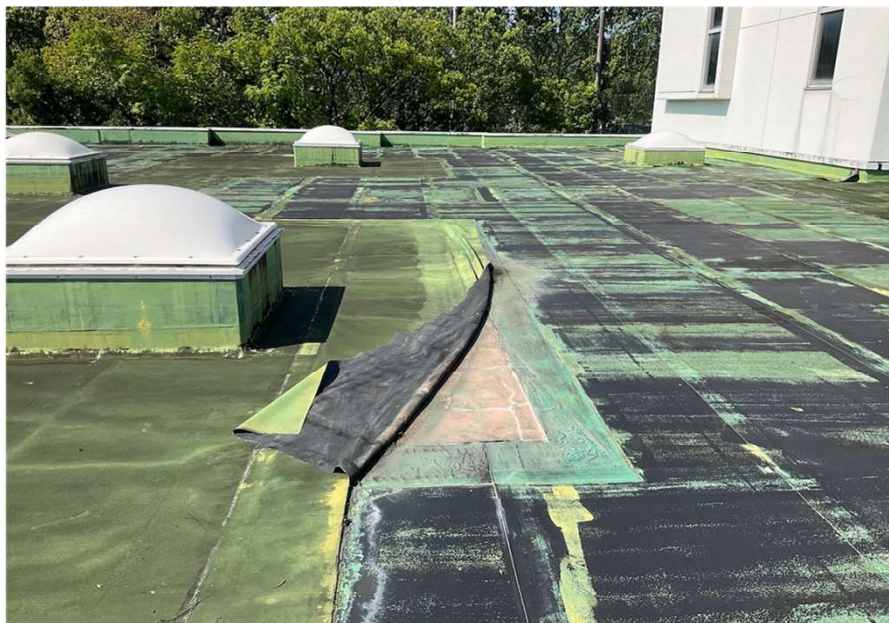

No. 83

土木、建築施設

処理棟屋上

全体的に劣化しており、一部防水シートの剥がれが認められる。

要補修



No. 84

土木、建築施設

処理棟屋上

全体的に劣化しており、一部防水シートの剥がれが認められる。

要補修



No. 85

土木、建築施設

旧排ガス監視室

外壁にクラックが認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 86

土木、建築施設

発電機室

床面にクラック(大半が補修済)が認められるが、特に支障は認められない。

良




No. 87

土木、建築施設

電気室(A)

壁面にクラックが認められるが、特に支障は認められない。

良

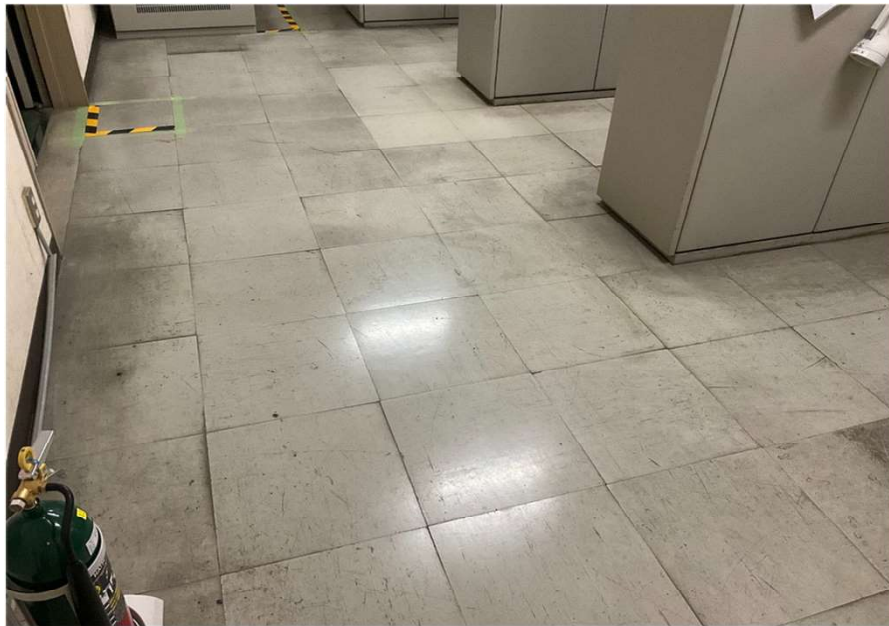

No. 88

土木、建築施設

電気室(B)CC盤室

床面にがたつきが認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 89

土木、建築施設

水質試験室

扉の横にクラックが認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 90

土木、建築施設

細菌試験室

壁紙の剥がれが認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 91

土木、建築施設

事務室

壁面にクラックが認められるが、特に支障は認められない。

良




No. 92

土木、建築施設

事務室

壁面にクラックが認められるが、特に支障は認められない。

良

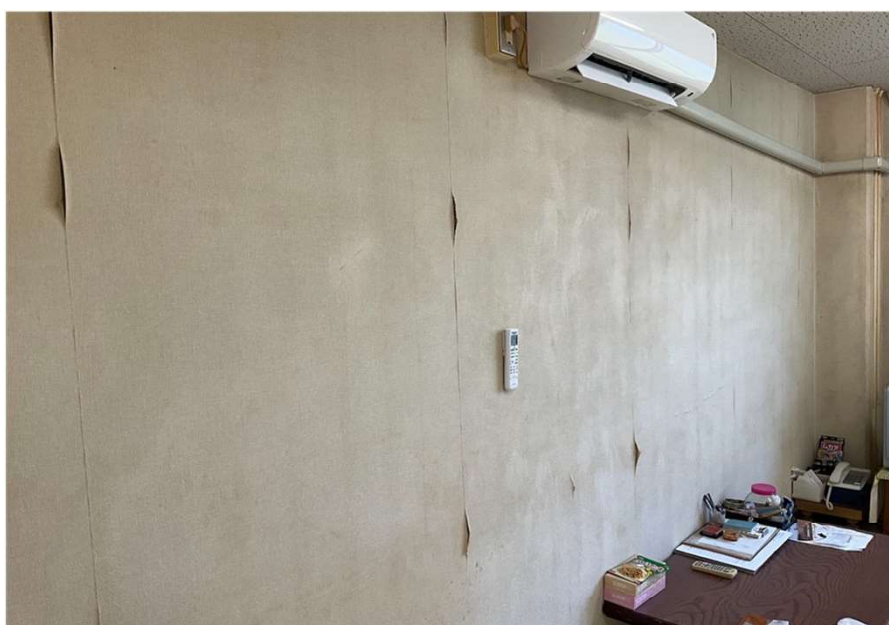

No. 93

土木、建築施設

休憩室

(管理棟1F)

壁紙の劣化が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 94

土木、建築施設

男子更衣室

壁紙の剥がれが認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 95

土木、建築施設

データログ室

床面にがたつきが認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 96

土木、建築施設

選択制御盤室

壁紙が漏水により剥がれている。(要観察)

良



No. 97

土木、建築施設

選択制御盤室

エアコンからの漏水が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 98

土木、建築施設

中央監視制御室

壁面にクラックが認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 99

土木、建築施設

水ingAM(株)

高知管理事務所
壁紙が多数剥がれているが、特に支障は認められない。

良



No. 100

土木、建築施設

水ingAM(株)

高知管理事務所

壁紙が多数剥がれているが、特に支障は認められない。

良



No. 101

土木、建築施設

会議室(2F)

壁紙が多数剥がれているが、特に支障は認められない。

良



No. 102

土木、建築施設

会議室(2F)

壁紙が多数剥がれているが、特に支障は認められない。

良



No. 103

土木、建築施設

書庫

壁面にクラックが認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 104

土木、建築施設

管理棟-処理棟

連絡通路

壁面にクラックが多数認められ、一部に漏水跡が認められる。(要観察)

良



No. 105

土木、建築施設

管理棟-処理棟

連絡通路

壁面にクラックが多数認められ、一部に漏水跡が認められる。(要観察)

良



No. 106

土木、建築施設

処理棟外壁

北面

クラック、漏水跡が多数認められる。(要観察)

良



No. 107

土木、建築施設

処理棟外壁

北面

クラック、漏水跡が多数認められる。(要観察)

良



No. 108

土木、建築施設

処理棟外壁

北面

クラック、漏水跡が多数認められる。(要観察)

良



No. 109

土木、建築施設

処理棟外壁

北面

クラック、漏水跡が多数認められる。(要観察)

良



No. 110

土木、建築施設

処理棟外壁

北面

クラック、漏水跡が多数認められる。(要観察)

良



No. 111


土木、建築施設

処理棟外壁

北面

クラック、漏水跡が多数認められる。(要観察)

良

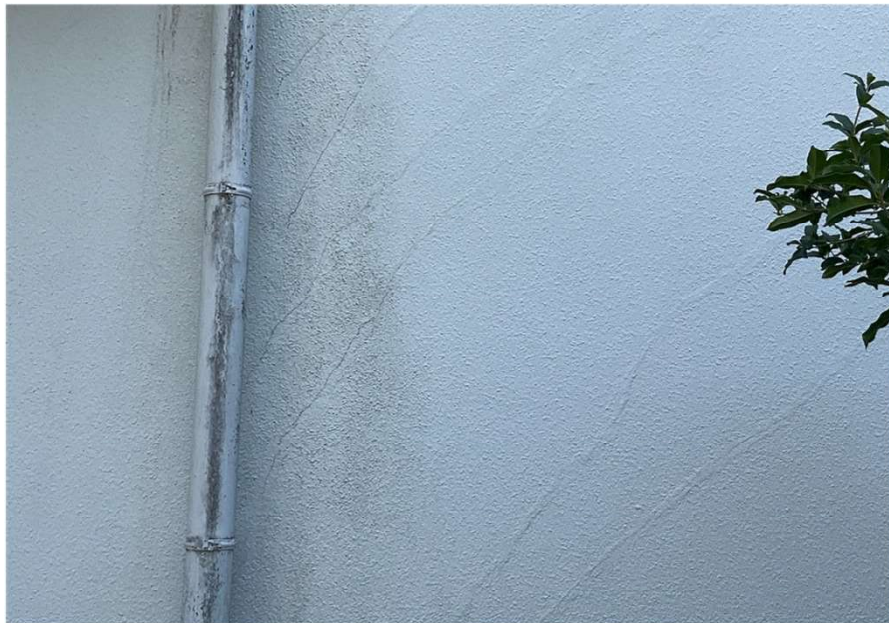

No. 112

土木、建築施設

処理棟外壁

東面

クラックが多数認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 113

土木、建築施設

処理棟外壁

南面

クラックが多数認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 114

土木、建築施設

処理棟外壁

南面

クラックが多数認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 115

土木、建築施設

処理棟外壁

南面

クラックが多数認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 116

土木、建築施設

処理棟外壁

南面

踏込に欠損が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 117

土木、建築施設

処理棟外壁

南面

ドアの塗装の劣化が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 118

土木、建築施設

処理棟外壁

西面

クラックが多数認められる。(要観察)

良



No. 119


土木、建築施設

処理棟外壁

西面

クラックが多数認められる。(要観察)

良

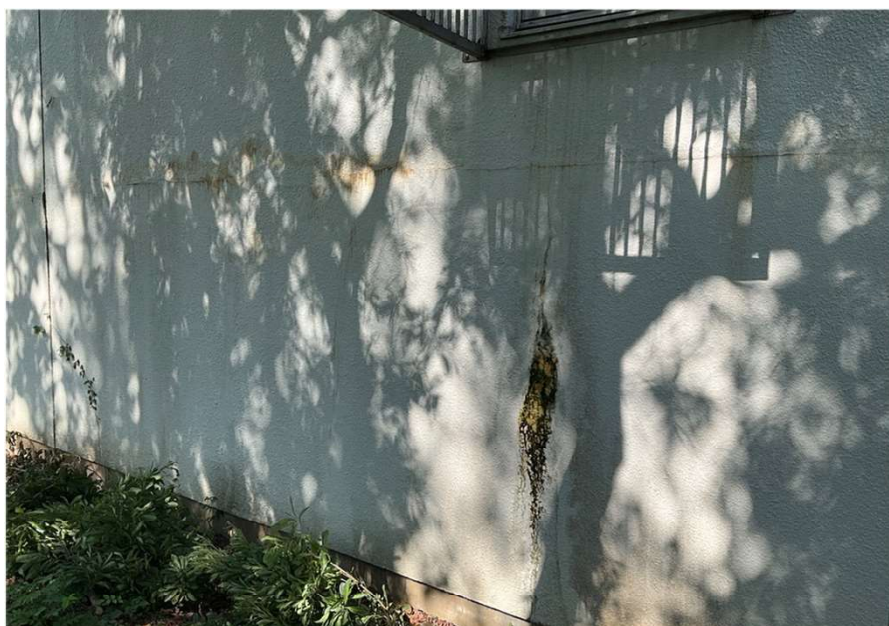

No. 120

土木、建築施設

処理棟外壁

西面

濃縮槽西側にクラック、漏水跡が認められる。

要補修



No. 121

土木、建築施設

管理棟外壁

北面

特に支障は認められない

良



No. 122

土木、建築施設

管理棟外壁

北面

特に支障は認められない

良



No. 123

土木、建築施設

管理棟外壁

東面

特に支障は認められない

良



No. 124

土木、建築施設

管理棟外壁

南面

特に支障は認められない

良



No. 125

土木、建築施設

管理棟外壁

西面

ドアの塗装の劣化が認められるが、特に支障は認められない。

良



No. 126

土木、建築施設

管理棟外壁

西面

ドアの塗装の劣化が認められるが、特に支障は認められない。

良
