

## (1) 斎場整備事業について

工程表（案）

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
待合棟	設計変更	発注	工事			
火葬棟	設計変更	発注	工事			
式場棟			設計変更	発注	工事	
外構					設計変更	工事

### 待合棟増改修工事

待合棟厨房増築，換気設備増強更新，照明LED化更新，屋上防水工事等を行います。  
工期：令和5年3月工事着手，令和5年9月完成を予定しています。


### 火葬棟改修工事

炉前ホール・告別ホールの天井および高所部分の大理石を撤去，告別室2室を収骨室としても使えるよう改修，正面の目隠し壁の撤去，空調・換気機能増強更新，照明LED化更新等を行います。  
工期：令和5年10月工事着手，令和6年12月頃完成を予定しています。


### 式場棟改修工事

式場ホールの天井および高所部分の大理石を撤去，トイレ洋式化，空調・換気機能更新，照明LED化更新等を行います。  
設計：令和6年度  
工期：令和7年工事着手を予定しています。


## (2) 待合棟増改修工事について (令和5年3月~9月)

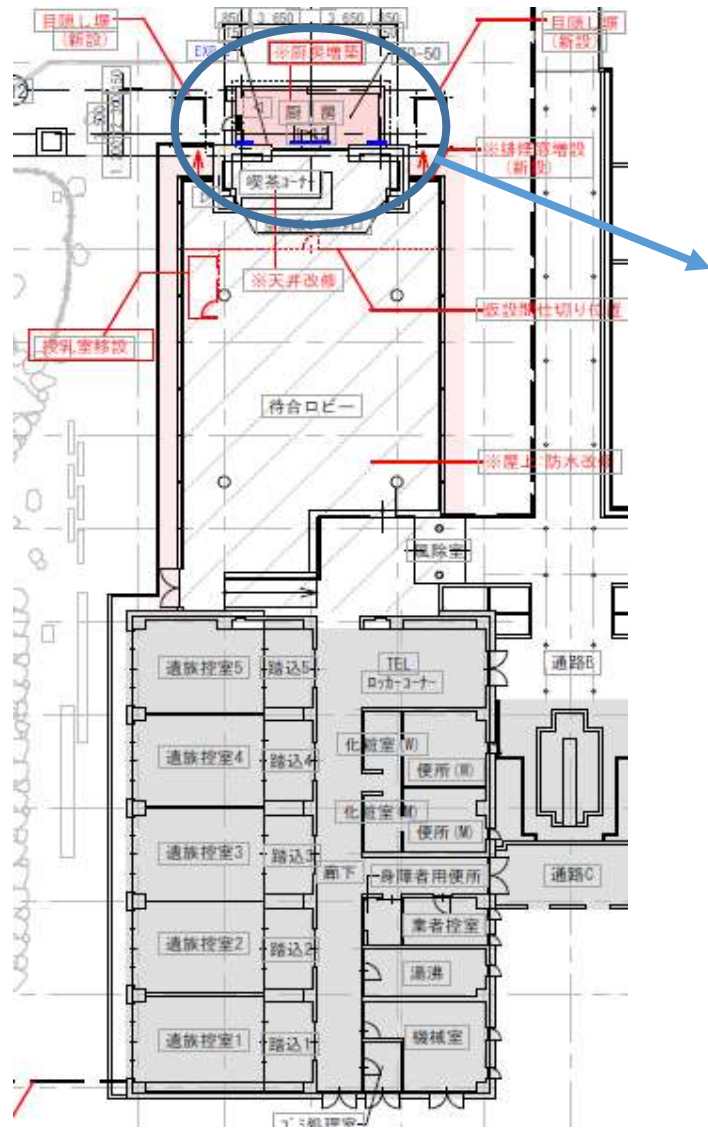

現況平面詳細図 1/50

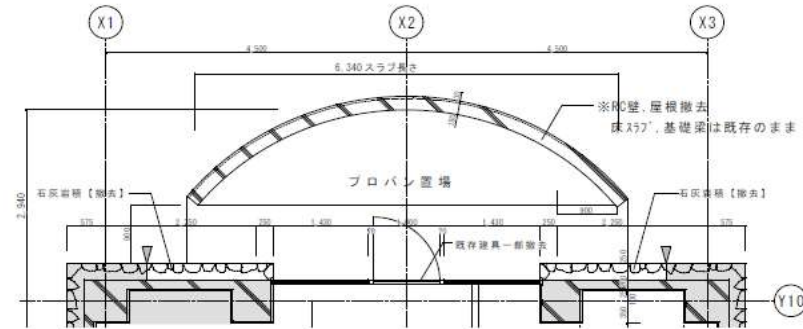


改修平面詳細図 1/50

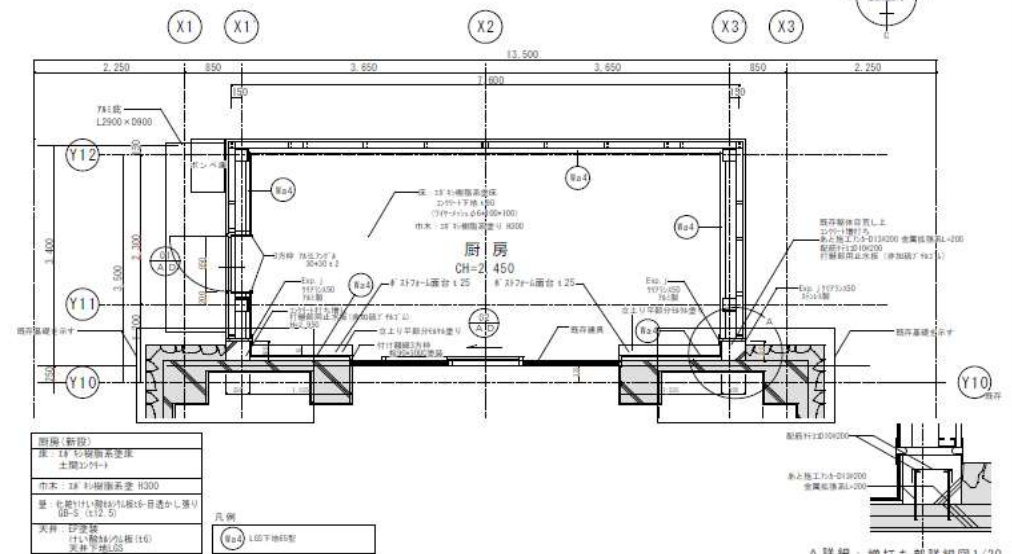

A 詳細: 増打ち部詳細図 1/20

### (3) 火葬棟改修工事について（令和5年10月～令和6年12月予定）

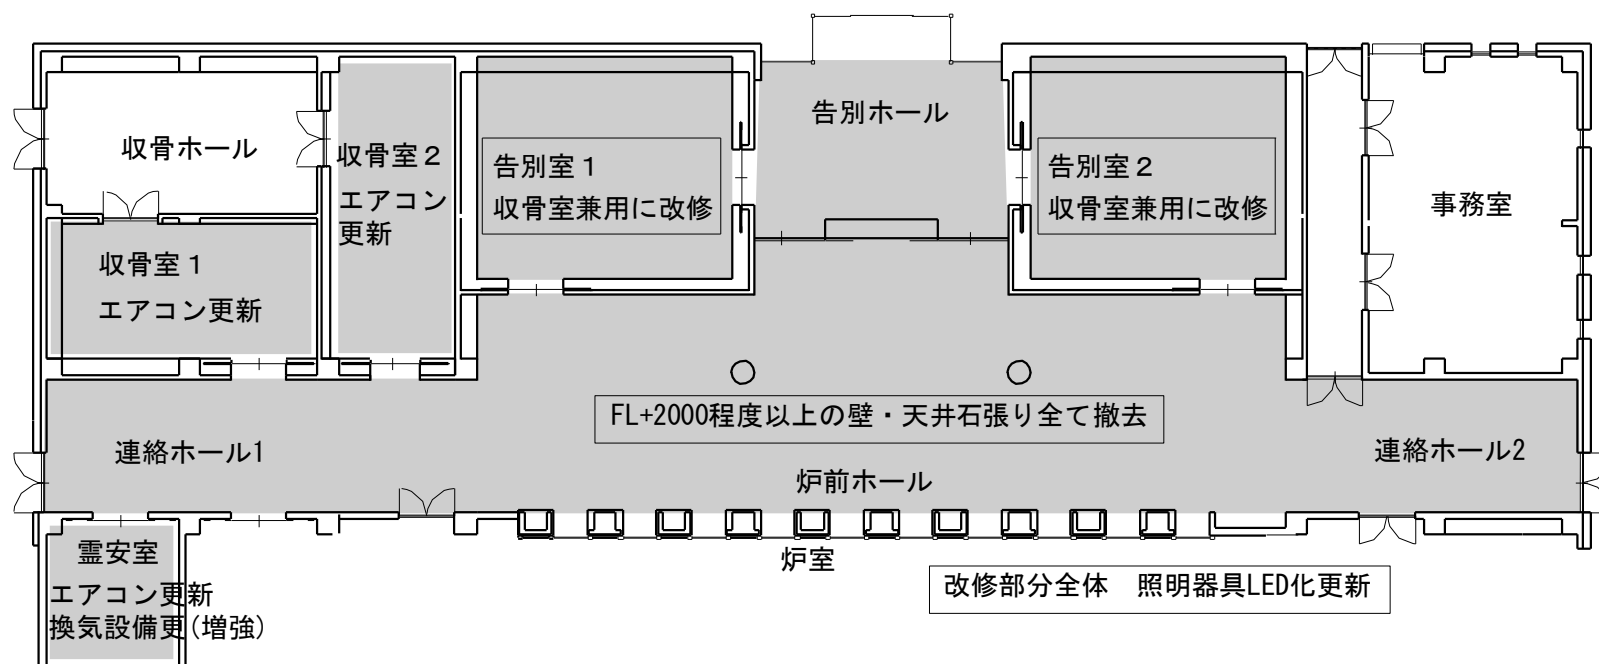


#### 火葬棟改修工事

地震対策として炉前ホール・告別ホールの天井および高所部分の大理石を撤去する。  
告別室2室を収骨室としても使えるよう改修し、火葬件数の増加（特に大規模災害時）に備える。  
正面の目隠し壁の撤去。収骨室等の結露対策として、空調・換気機能の向上を図る。  
改修する部分全体の照明LED化更新をします。


基本的に工事等は、お別れ・収骨時の騒音や安全を考慮し、友引と夜間に実施することで、工期を短縮します。  
夜間工事は、19:30～翌7:00頃を予定しております。  
夜間工事の期間中は、騒音のため式場の通夜での宿泊が困難となります。

来客のある部分の改修を令和5～6年度で行い、バックヤード部分については後年度で行う予定。

(4) ①火葬棟改修工事期間中の利用について 炉前ホール工事（令和5年10月～令和6年2月予定）

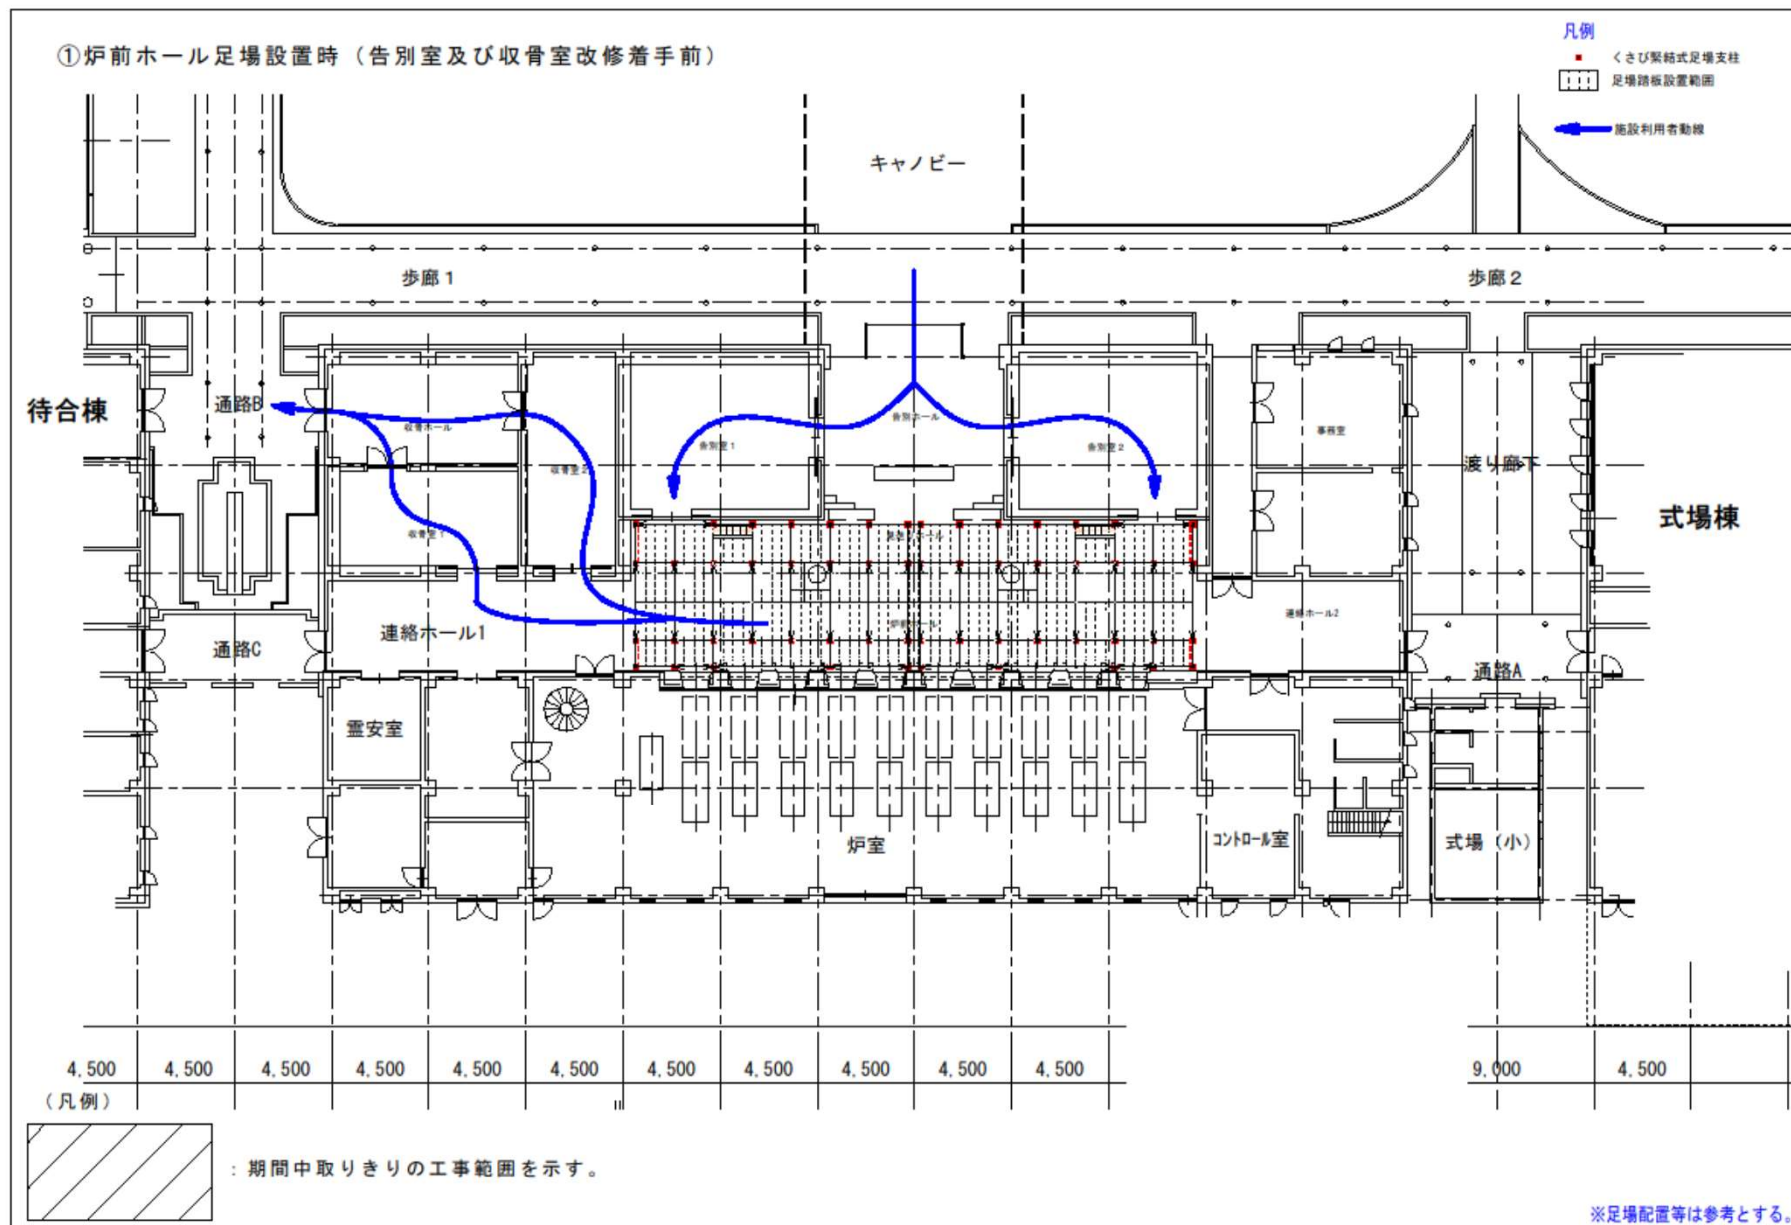

(4) ②火葬棟改修工事期間中の利用について 告別室工事 (令和6年3月~)

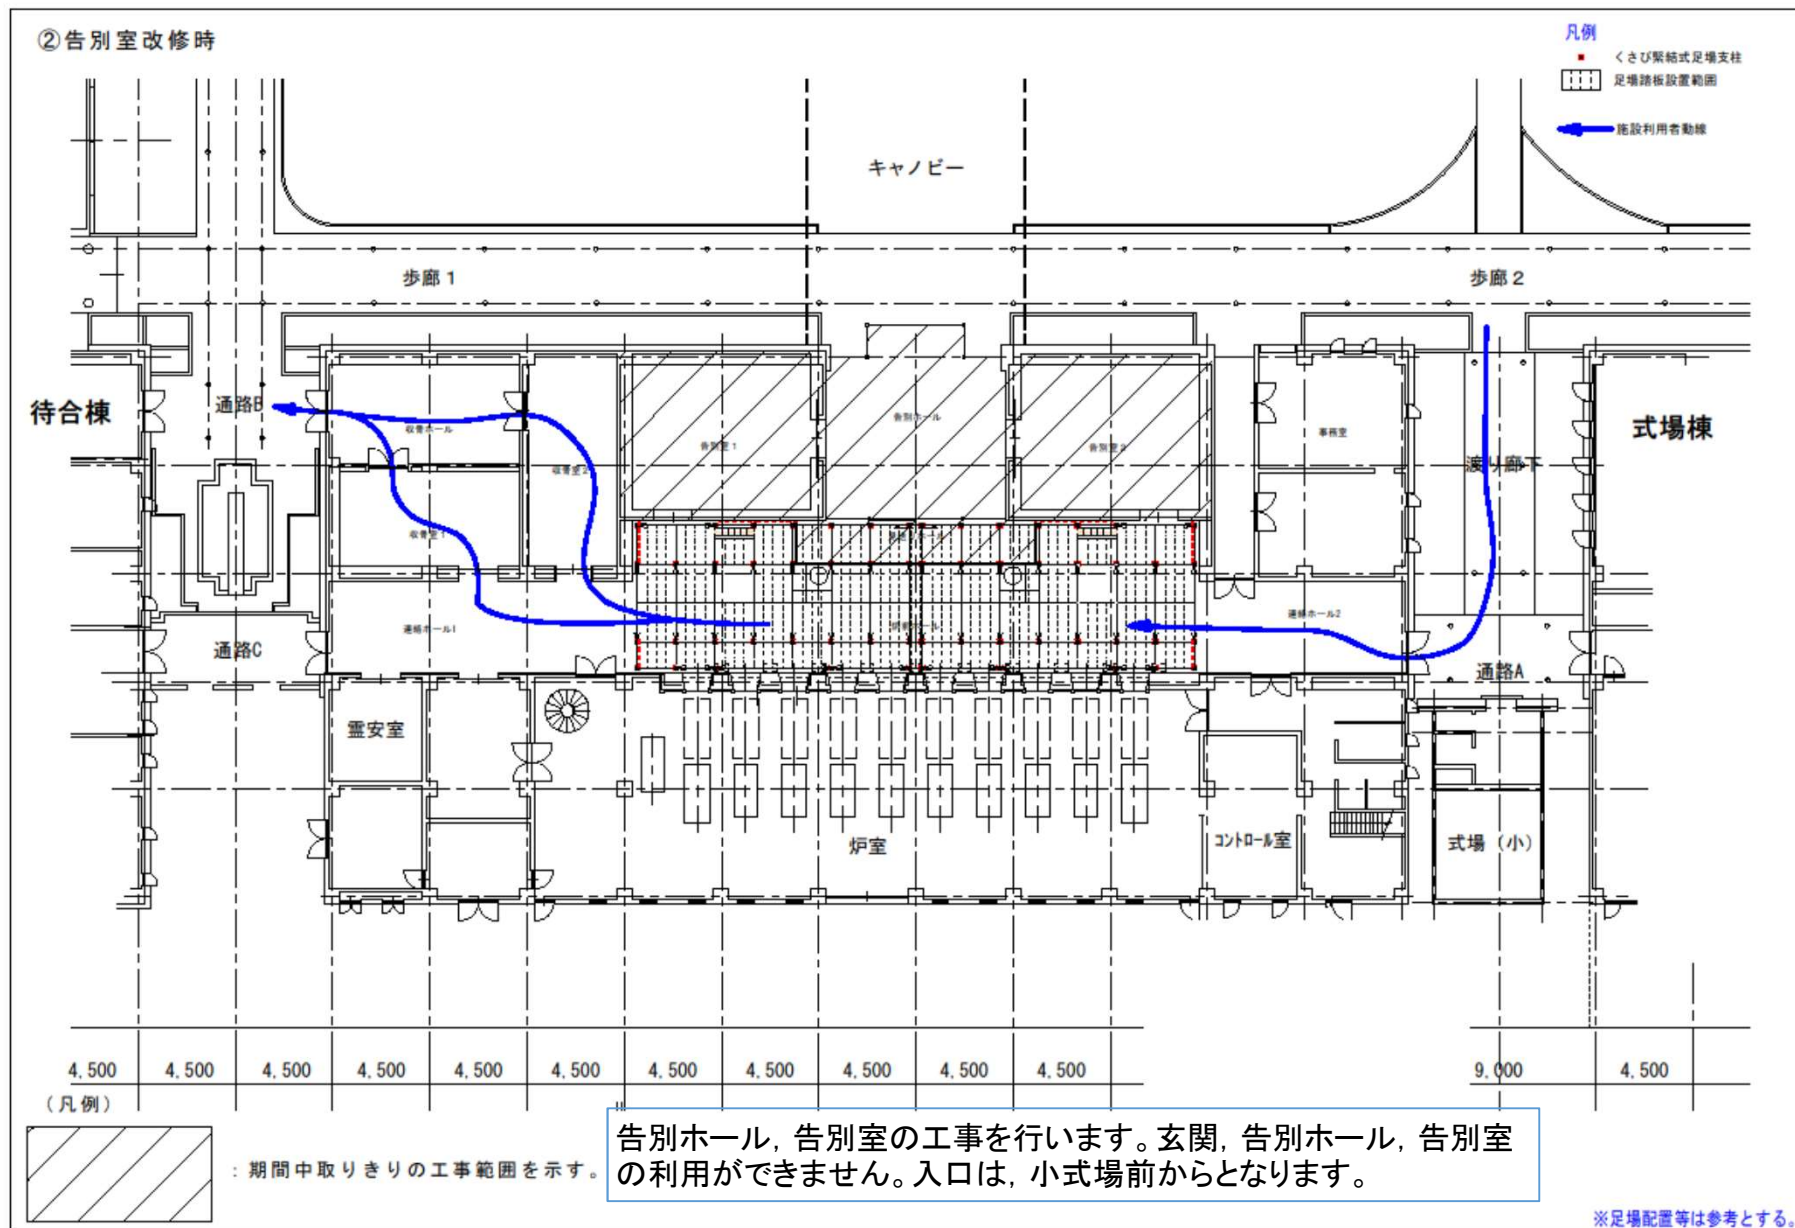

## (4) ② 告別室の工事期間の炉入れ・告別等について

- ・告別ホールの工事期間は、正面からの出入りができない期間は、お棺・ご遺族の入口を式場側の連絡ホール2（小式場前）にして対応します。小式場前で待機していただき、炉入れに向かいます。出口は、事務所横の通路を使用します。ただし、小式場でお葬式を行っている時のご遺族の入口は、事務所横の通路とします。

霊柩車は、段差や雨を考慮して、通常通り告別ホール前のキャノピーに停めていただき、お棺を棺運搬車に載せ替えして遺族が集合した後に小式場前を通り炉前へと移動していただく予定です。

- ・告別室・収骨室の工事期間中は、告別室でのお別れができません。告別室・収骨室の工事終了後は、準備ができ次第、告別室での最後のお別れを行えるようにします。

### ・告別室が使用できない間の告別について


炉前ホールは、30分間毎に炉入れ2件、収骨のお迎え2件の計4件を行っている。それぞれ3～5分の時間を要するため、告別を炉前ホールで行うとした場合の告別の時間は炉入れ時間を含め最大10分程度となります。また、炉入れ予定時間ギリギリの来場、2家族が重なった場合等を考慮して対応を決定する必要があります。時間に余裕を持ってきて来場していただけた場合、炉前で告別の時間を取れるようになります。

霊柩車の到着時間ではなく、遺族も含めた集合完了時間で判断し、下記のとおり告別時間を設定することといたします。


集合後、入場の際に告別の時間をお知らせいたします。

集合時間	告別時間
0～10分前	なし
11～20分前	5分程度
21～30分前	10分程度

告別時間は、炉前ホールで祝詞・読経等のほか、霊安室利用後の最後のお別れとして棺を開けて最後のお別れやお花を入れることができる時間とします。

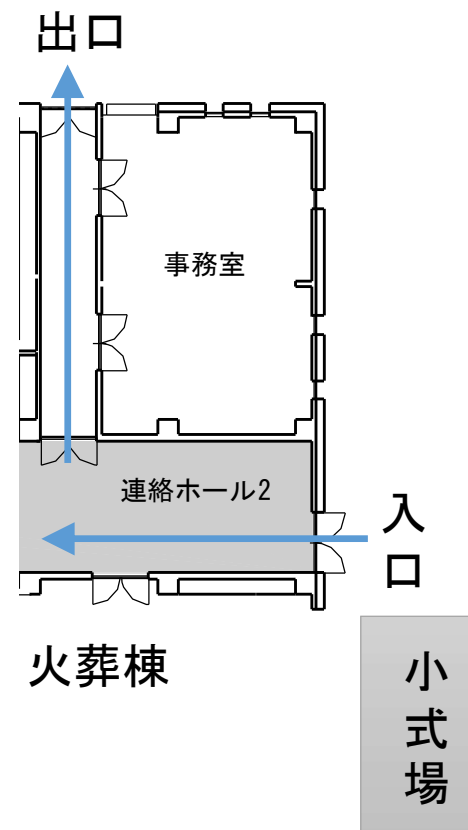

## (4) ③火葬棟改修工事期間中の利用について

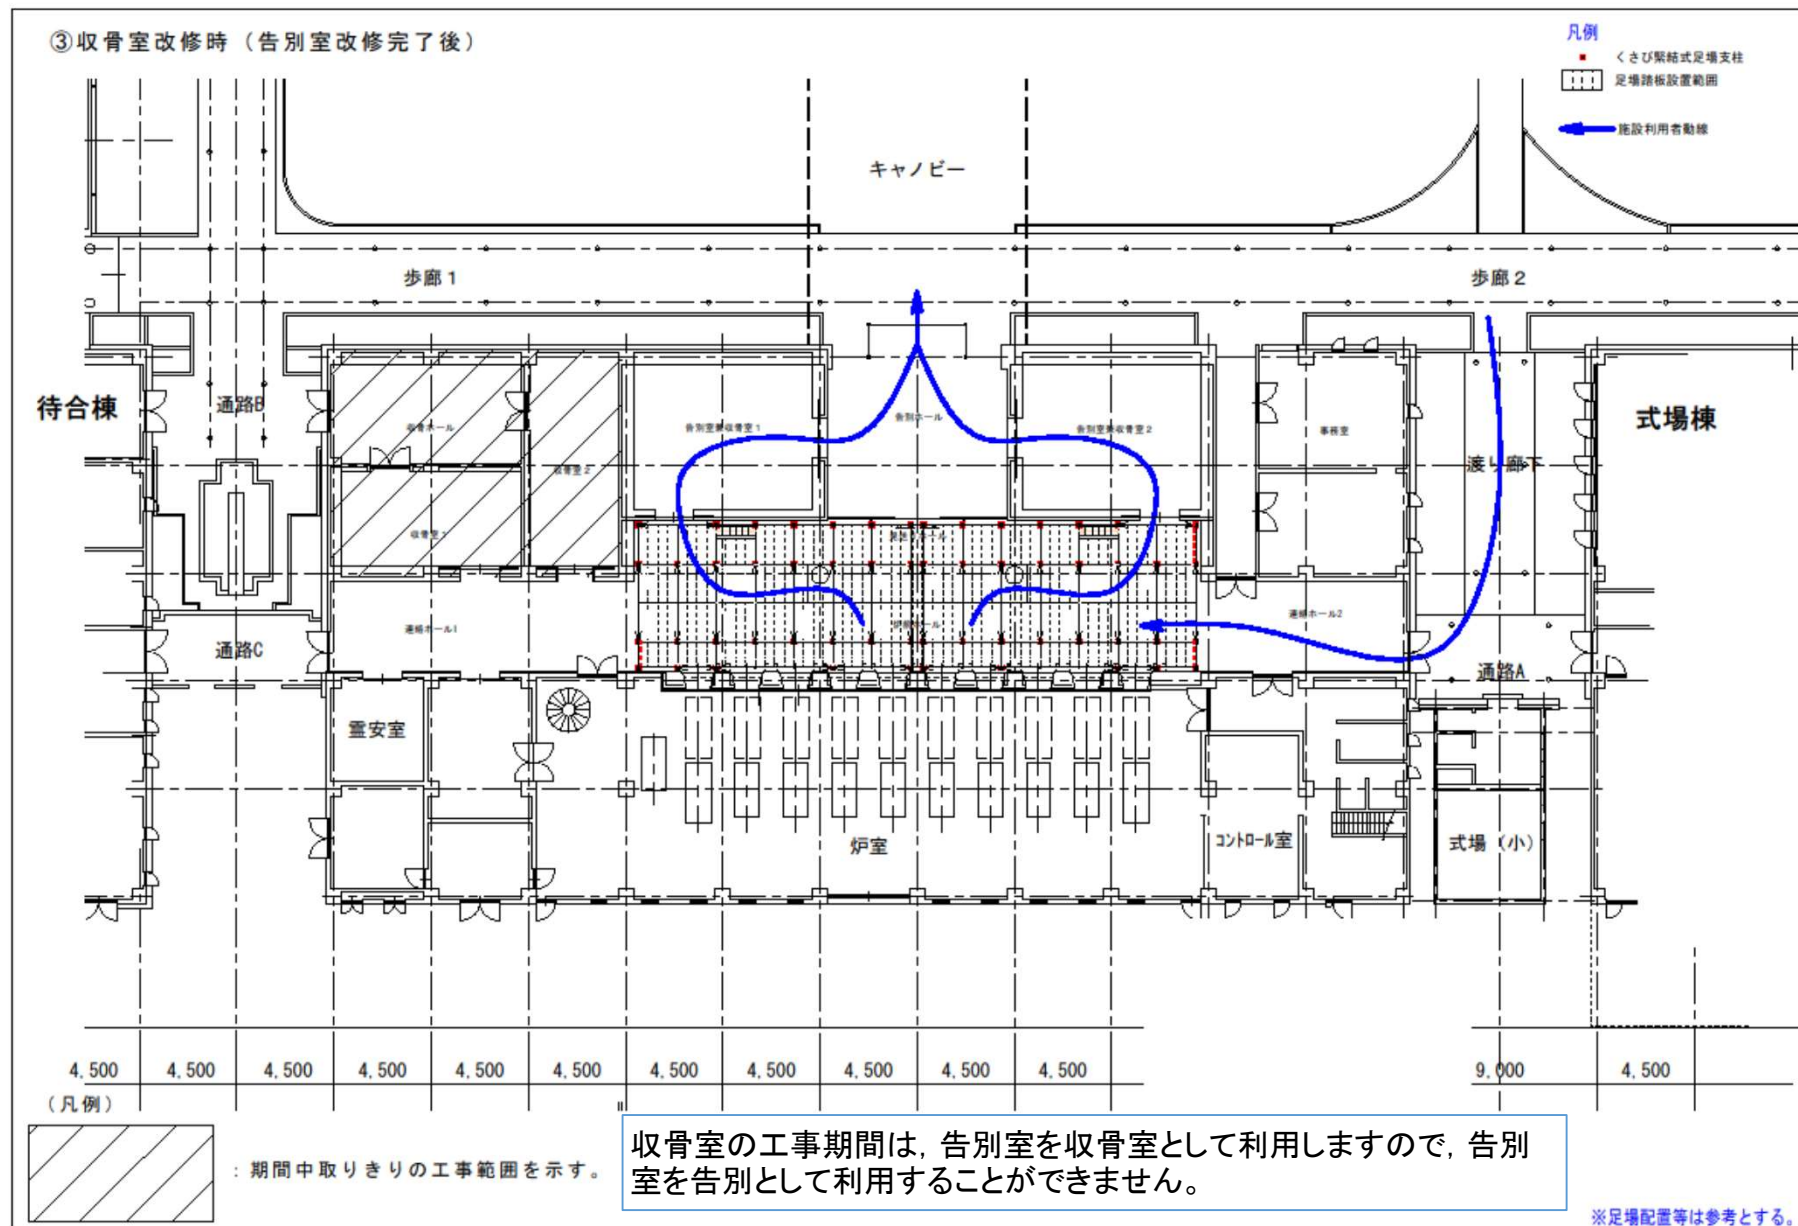

## (5) その他

繁忙期の火葬件数の増加への対応のため、  
友引1月9日(火)に斎場の開場を検討

今後の火葬件数の増加への対応として検討項目となっている友引の開場について、高知市での友引開場による効果を計るため、友引の開場を検討しています。

宗教観や友引の字面から来る嫌悪感から葬儀・火葬は友引を避ける習わしがありますが、近年は都市部を中心に友引を考慮しない葬儀等も行われるようになってきており、友引に火葬をおこなっている火葬場もあります。

令和6年1月は、元旦による休場や友引の間隔が短くなる日があるため特に繁忙が予想されています。友引の中で1月9日(火)の1日のみ斎場を開場して友引の火葬需要や友引火葬の効果の有無を検証したいと考えています。

2023年  
令和5年  
12月

日	月	火	水	木	金	土
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

2024年  
令和6年  
1月

日	月	火	水	木	金	土
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

 : 友引
